



แผนการดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

ID	Task Name	2011					
		Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1
1	แผนการดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย	[Gantt Bar]					
2	การทำสัญญาซื้อขาย (Sign Contract)	[Gantt Bar]					
3	การทำสัญญาซื้อขาย (Sign Contract)	[Gantt Bar]					
4	การประชุมเริ่มโครงการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Kickoff Meeting)	[Gantt Bar]					
5	ส่งมอบแผนดำเนินโครงการ 30 วันนับแต่วันลงนามในสัญญา	[Gantt Bar]					
6	การสำรวจสถานที่ติดตั้งของงานทั้ง 3 ระยะ	[Gantt Bar]					
7	การสำรวจสถานที่ติดตั้งของงานระยะที่ 1 15 สถานี	[Gantt Bar]					
8	การสำรวจสถานที่ติดตั้งของงานระยะที่ 2 18 สถานี	[Gantt Bar]					
9	การสำรวจสถานที่ติดตั้งของงานระยะที่ 3 46 สถานี	[Gantt Bar]					
10	จัดทำรายละเอียดของการออกแบบ (Design review)	[Gantt Bar]					
11	การทดลองเพื่อยืนยันหลักการออกแบบระบบ(Proof Of Concept)	[Gantt Bar]					
12	การจัดทำแบบการติดตั้งทั้ง 3 ระยะ	[Gantt Bar]					
13	การส่งแบบการติดตั้งเพื่อขออนุมัติ ของงานระยะที่ 1	[Gantt Bar]					
14	การส่งแบบการติดตั้งเพื่อขออนุมัติ ของงานระยะที่ 2	[Gantt Bar]					
15	การส่งแบบการติดตั้งเพื่อขออนุมัติ ของงานระยะที่ 3	[Gantt Bar]					
16	การประชุมเพื่อวางแผนทางด้านวิศวกรรมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	[Gantt Bar]					
17	การประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้า การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร	[Gantt Bar]					
142	การดำเนินงาน ติดตั้ง ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ระยะที่ 1	[Gantt Bar]					
143	การส่งอุปกรณ์หลักจากผู้ผลิต ระยะที่ 1	[Gantt Bar]					
144	การทดสอบอุปกรณ์ในลักษณะ Unit Test	[Gantt Bar]					
145	ขนส่งอุปกรณ์ไปยังสถานที่ติดตั้ง	[Gantt Bar]					
146	ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนกลาง จำนวน 3 แห่ง	[Gantt Bar]					
147	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	[Gantt Bar]					
148	ดำเนินการเชื่อมโยงต่อระบบสื่อสารกับศูนย์การสื่อสารใหม่ถนนแจ้งวัฒนะ	[Gantt Bar]					
149	ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	[Gantt Bar]					
150	ติดตั้งอุปกรณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จำนวน 2 แห่ง	[Gantt Bar]					
151	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต อยุธยา	[Gantt Bar]					
152	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครปฐม	[Gantt Bar]					
153	ติดตั้งอุปกรณ์สถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 10 แห่ง	[Gantt Bar]					
154	สถานีสื่อสารจังหวัดนนทบุรี	[Gantt Bar]					
155	สถานีสื่อสารจังหวัดปทุมธานี	[Gantt Bar]					
156	สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรปราการ	[Gantt Bar]					
157	สถานีสื่อสารจังหวัดสระบุรี	[Gantt Bar]					
158	สถานีสื่อสารจังหวัดอ่างทอง	[Gantt Bar]					
159	สถานีสื่อสารจังหวัดสิงห์บุรี	[Gantt Bar]					
160	สถานีสื่อสารจังหวัดสุพรรณบุรี	[Gantt Bar]					
161	สถานีสื่อสารจังหวัดราชบุรี	[Gantt Bar]					
162	สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสาคร	[Gantt Bar]					
163	สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสงคราม	[Gantt Bar]					
164	การทดสอบในลักษณะ Sub-System Test ระยะที่ 1	[Gantt Bar]					
165	ส่วนกลาง จำนวน 3 แห่ง	[Gantt Bar]					
166	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	[Gantt Bar]					
167	ดำเนินการเชื่อมโยงต่อระบบสื่อสารกับศูนย์การสื่อสารใหม่ถนนแจ้งวัฒนะ	[Gantt Bar]					
168	ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	[Gantt Bar]					
169	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จำนวน 2 แห่ง	[Gantt Bar]					
170	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต อยุธยา	[Gantt Bar]					
171	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครปฐม	[Gantt Bar]					
172	สถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 10 แห่ง	[Gantt Bar]					

Project: MOI-99L-08  
Date: Thu 19/11/09

Task [Pattern] Progress [Bar] Summary [Bar] External Tasks [Bar] Deadline [Arrow]

Split [Pattern] Milestone [Diamond] Project Summary [Bar] External Milestone [Diamond]



(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง

แผนการดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

ID	Task Name	2011					
		Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1
173	สถานีสื่อสารจังหวัดนนทบุรี						
174	สถานีสื่อสารจังหวัดปทุมธานี						
175	สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรปราการ						
176	สถานีสื่อสารจังหวัดสระบุรี						
177	สถานีสื่อสารจังหวัดอ่างทอง						
178	สถานีสื่อสารจังหวัดสิงห์บุรี						
179	สถานีสื่อสารจังหวัดสุพรรณบุรี						
180	สถานีสื่อสารจังหวัดราชบุรี						
181	สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสาคร						
182	สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสงคราม						
183	การเชื่อมระบบโทรศัพท์ใหม่เข้ากับระบบโทรศัพท์และเครือข่ายเดิม(Migration) ระยะที่ 1						
184	ส่วนกลาง จำนวน 3 แห่ง						
185	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
186	ดำเนินการเชื่อมโยงต่อระบบสื่อสารกับศูนย์การสื่อสารใหม่ถนนแจ้งวัฒนะ						
187	ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
188	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จำนวน 2 แห่ง						
189	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต อยุธยา						
190	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครปฐม						
191	สถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 10 แห่ง						
192	สถานีสื่อสารจังหวัดนนทบุรี						
193	สถานีสื่อสารจังหวัดปทุมธานี						
194	สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรปราการ						
195	สถานีสื่อสารจังหวัดสระบุรี						
196	สถานีสื่อสารจังหวัดอ่างทอง						
197	สถานีสื่อสารจังหวัดสิงห์บุรี						
198	สถานีสื่อสารจังหวัดสุพรรณบุรี						
199	สถานีสื่อสารจังหวัดราชบุรี						
200	สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสาคร						
201	สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสงคราม						
202	การฝึกอบรม						
203	หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานประจำสถานีกลุ่มที่ 1						
204	การทดสอบในลักษณะ Overall System Test ระยะที่ 1						
205	การส่งมอบและตรวจรับโครงการระยะที่ 1						
206	การดำเนินงาน ติดตั้ง ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ระยะที่ 2						
207	การส่งอุปกรณ์หลักจากผู้ผลิต ระยะที่ 2						
208	การทดสอบอุปกรณ์ในลักษณะ Unit Test						
209	ขนส่งอุปกรณ์ไปยังสถานีที่ติดตั้ง						
210	ส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง						
211	ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยและเชื่อมต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
212	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จำนวน 3 แห่ง						
213	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต สุราษฎร์ธานี						
214	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครศรีธรรมราช						
215	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต สงขลา						
216	สถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 14 แห่ง						
217	สถานีสื่อสารจังหวัดกาญจนบุรี						
218	สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบุรี						
219	สถานีสื่อสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์						
220	สถานีสื่อสารจังหวัดชุมพร						

ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ


ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ

ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ

ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ

ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ

ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ

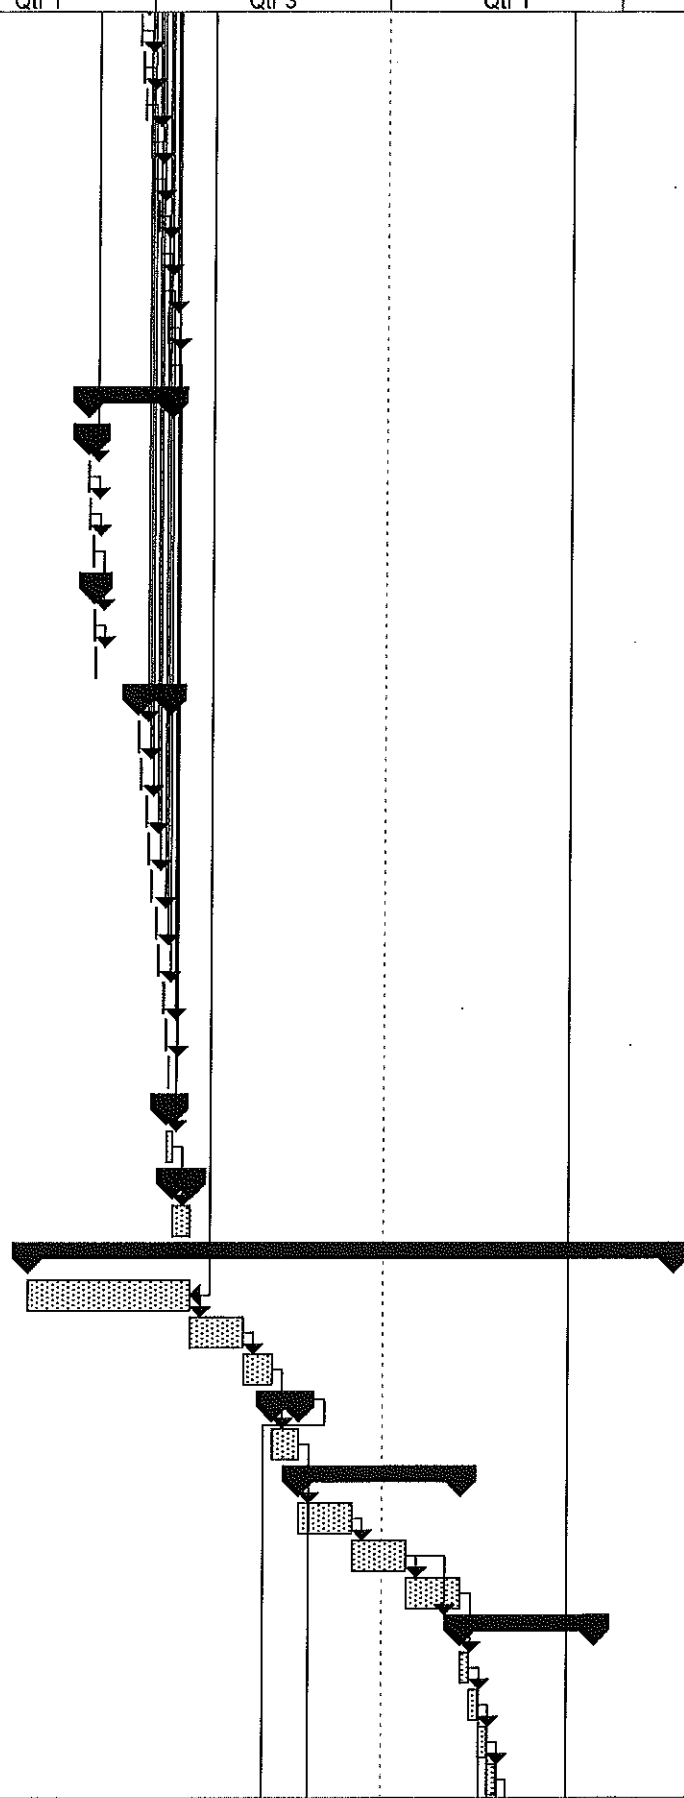


Project: MOI-99L-08  
Date: Thu 19/11/09

Task Progress Summary External Tasks Deadline

Split Milestone Project Summary External Milestone

(ลงชื่อ) *[Signature]* 0158



(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง



แผนการดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

ID	Task Name	2011					
		Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1
221	สถานีสื่อสารจังหวัดระนอง						
222	สถานีสื่อสารจังหวัดพังงา						
223	สถานีสื่อสารจังหวัดภูเก็ต						
224	สถานีสื่อสารจังหวัดกระบี่						
225	สถานีสื่อสารจังหวัดพัทลุง						
226	สถานีสื่อสารจังหวัดตรัง						
227	สถานีสื่อสารจังหวัดสตูล						
228	สถานีสื่อสารจังหวัดปัตตานี						
229	สถานีสื่อสารจังหวัดยะลา						
230	สถานีสื่อสารจังหวัดนราธิวาส						
231	สอบต						
232	การทดสอบในลักษณะ Sub-System Test ระยะเวลา 2						
233	ส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง						
234	ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยและเชื่อมต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
235	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จำนวน 3 แห่ง						
236	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต สุราษฎร์ธานี						
237	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครศรีธรรมราช						
238	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต สงขลา						
239	สถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 14 แห่ง						
240	สถานีสื่อสารจังหวัดกาญจนบุรี						
241	สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบุรี						
242	สถานีสื่อสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์						
243	สถานีสื่อสารจังหวัดชุมพร						
244	สถานีสื่อสารจังหวัดระนอง						
245	สถานีสื่อสารจังหวัดพังงา						
246	สถานีสื่อสารจังหวัดภูเก็ต						
247	สถานีสื่อสารจังหวัดกระบี่						
248	สถานีสื่อสารจังหวัดพัทลุง						
249	สถานีสื่อสารจังหวัดตรัง						
250	สถานีสื่อสารจังหวัดสตูล						
251	สถานีสื่อสารจังหวัดปัตตานี						
252	สถานีสื่อสารจังหวัดยะลา						
253	สถานีสื่อสารจังหวัดนราธิวาส						
254	สอบต						
255	การเชื่อมระบบโทรศัพท์ใหม่เข้ากับระบบโทรศัพท์และเครือข่ายเดิม(Migration) ระยะเวลา 2						
256	ส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง						
257	ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยและเชื่อมต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
258	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จำนวน 3 แห่ง						
259	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต สุราษฎร์ธานี						
260	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครศรีธรรมราช						
261	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต สงขลา						
262	สถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 14 แห่ง						
263	สถานีสื่อสารจังหวัดกาญจนบุรี						
264	สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบุรี						
265	สถานีสื่อสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์						
266	สถานีสื่อสารจังหวัดชุมพร						
267	สถานีสื่อสารจังหวัดระนอง						
268	สถานีสื่อสารจังหวัดพังงา						

ประสานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ

ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ  
ตั้งชื่อ

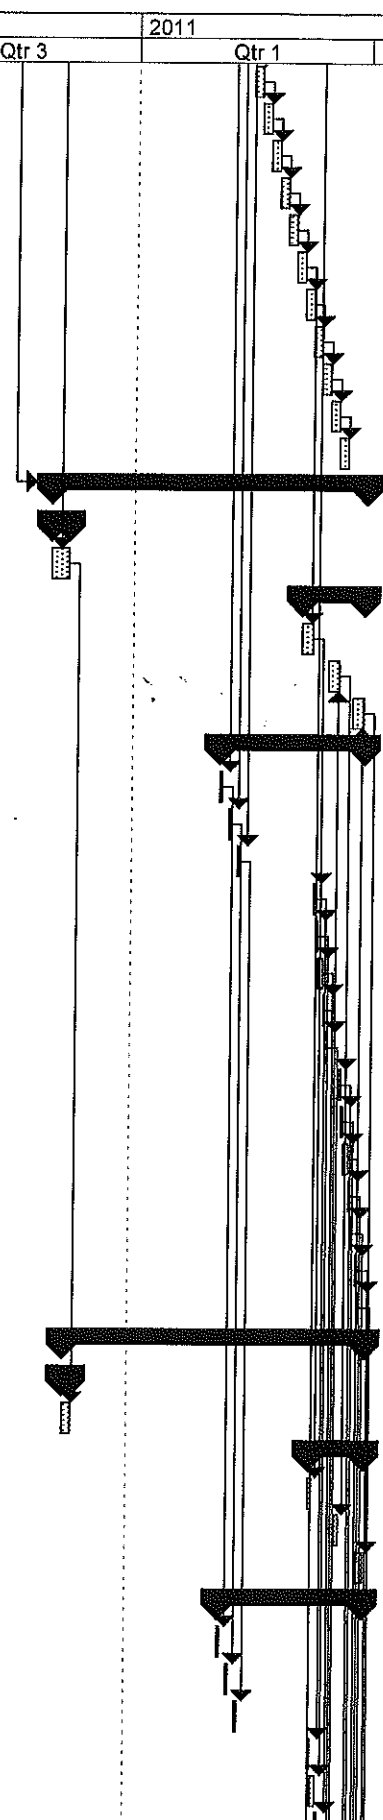

Project: MOI-99L-08 Date: Thu 19/11/09


Task Progress Summary External Tasks Deadline

Split Milestone Project Summary External Milestone

(ลงชื่อ) *วิวัฒน์ สุขุม* ผู้ว่าจ้าง

แผนการดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

ID	Task Name	2011						
		Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3
269	สถานีสื่อสารจังหวัดภูเก็ต							
270	สถานีสื่อสารจังหวัดกระบี่							
271	สถานีสื่อสารจังหวัดพังงา							
272	สถานีสื่อสารจังหวัดตรัง							
273	สถานีสื่อสารจังหวัดสตูล							
274	สถานีสื่อสารจังหวัดปัตตานี							
275	สถานีสื่อสารจังหวัดยะลา							
276	สถานีสื่อสารจังหวัดนราธิวาส							
277	คอมด							
278	การฝึกอบรม							
279	หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานประจำสถานีกลุ่มที่ 2							
280	การฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ							
281	การทดสอบในลักษณะ Overall System Test ระยะที่ 2							
282	การส่งมอบและตรวจรับโครงการระยะที่ 2							
283	การดำเนินงาน ติดตั้ง ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ระยะที่ 3							
284	การส่งอุปกรณ์หลักจากผู้ผลิต ระยะที่ 3							
285	การทดสอบอุปกรณ์ในลักษณะ Unit Test							
286	ขนส่งอุปกรณ์ไปยังสถานีที่ติดตั้ง							
287	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จำนวน 7 แห่ง							
288	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ชลบุรี							
289	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครราชสีมา							
290	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ขอนแก่น							
291	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต อุตรดิตถ์							
292	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครสวรรค์							
293	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต พิษณุโลก							
294	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต เชียงใหม่							
295	สถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 39 แห่ง							
296	สถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา							
297	สถานีสื่อสารจังหวัดปราจีนบุรี							
298	สถานีสื่อสารจังหวัดสระแก้ว							
299	สถานีสื่อสารจังหวัดนครนายก							
300	สถานีสื่อสารจังหวัดระยอง							
301	สถานีสื่อสารจังหวัดจันทบุรี							
302	สถานีสื่อสารจังหวัดตราด							
303	สถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์							
304	สถานีสื่อสารจังหวัดสุรินทร์							
305	สถานีสื่อสารจังหวัดศรีสะเกษ							
306	สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี							
307	สถานีสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์							
308	สถานีสื่อสารจังหวัดมหาสารคาม							
309	สถานีสื่อสารจังหวัดร้อยเอ็ด							
310	สถานีสื่อสารจังหวัดชัยภูมิ							
311	สถานีสื่อสารจังหวัดยโสธร							
312	สถานีสื่อสารจังหวัดอำนาจเจริญ							
313	สถานีสื่อสารจังหวัดหนองคาย							
314	สถานีสื่อสารจังหวัดสกลนคร							
315	สถานีสื่อสารจังหวัดนครพนม							
316	สถานีสื่อสารจังหวัดเลย							

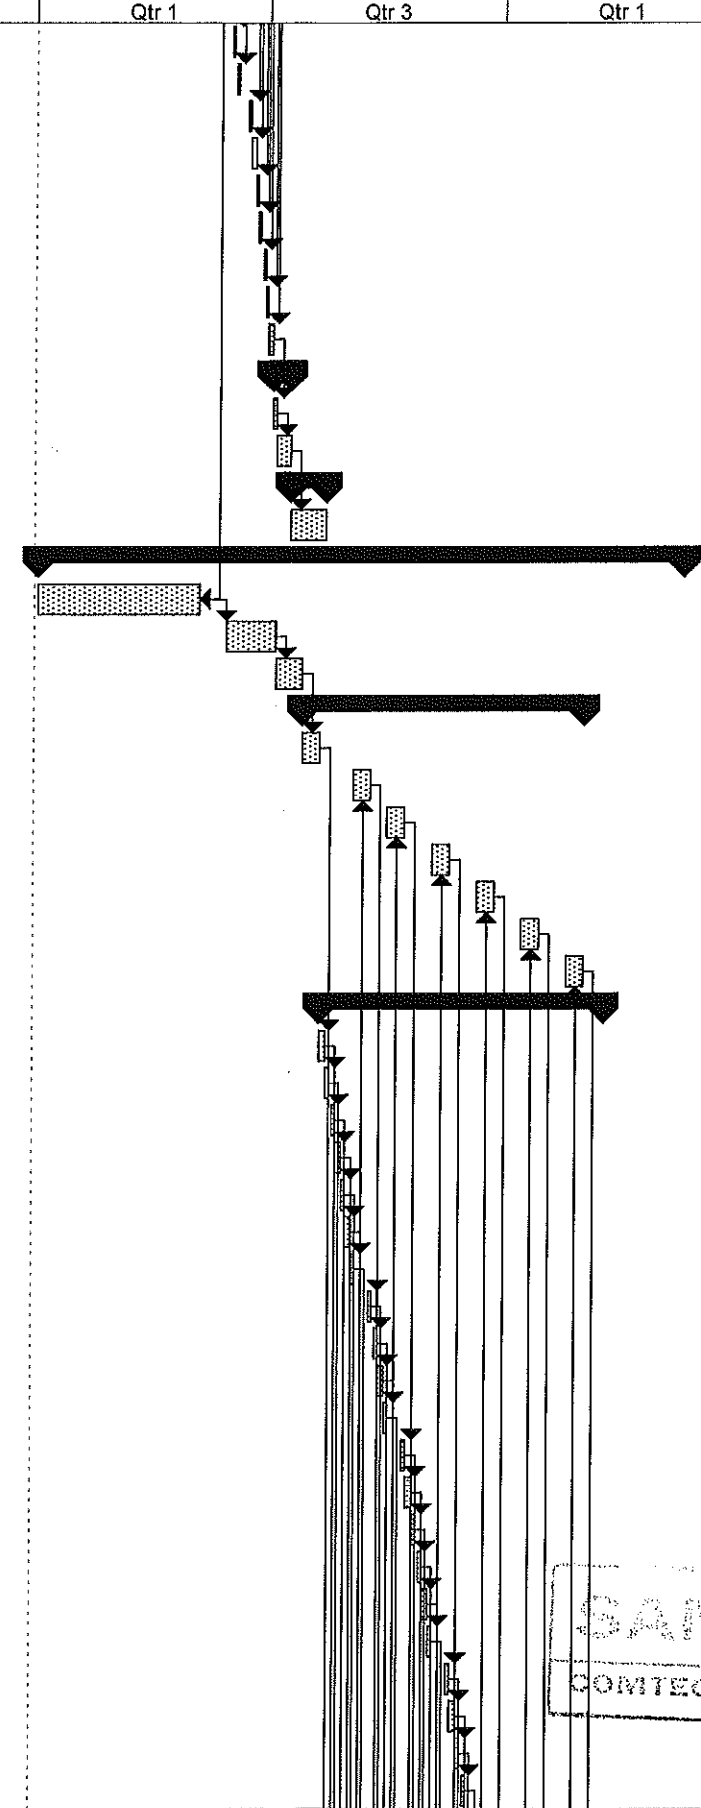

Project: MOI-99L-08  
Date: Thu 19/11/09

Task Progress   
Split Milestone

Summary   
Project Summary

External Tasks   
External Milestone

Deadline

**SAMART 160**  
COMTECH CO., LTD.



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

แผนการดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

ID	Task Name	2011		
		Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3
317	สถานีสื่อสารจังหวัดนุกดาหาร			
318	สถานีสื่อสารจังหวัดหนองบัวลำภู			
319	สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์			
320	สถานีสื่อสารจังหวัดลพบุรี			
321	สถานีสื่อสารจังหวัดชัยนาท			
322	สถานีสื่อสารจังหวัดอุทัยธานี			
323	สถานีสื่อสารจังหวัดพิจิตร			
324	สถานีสื่อสารจังหวัดกำแพงเพชร			
325	สถานีสื่อสารจังหวัดตาก			
326	สถานีสื่อสารจังหวัดสุโขทัย			
327	สถานีสื่อสารจังหวัดอุดรดิตถ์			
328	สถานีสื่อสารจังหวัดแพร่			
329	สถานีสื่อสารจังหวัดน่าน			
330	สถานีสื่อสารจังหวัดพะเยา			
331	สถานีสื่อสารจังหวัดเชียงราย			
332	สถานีสื่อสารจังหวัดลำพูน			
333	สถานีสื่อสารจังหวัดลำปาง			
334	สถานีสื่อสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน			
335	การทดสอบในลักษณะ Sub-System Test ระยะที่ 3			
336	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จำนวน 7 แห่ง			
337	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ชลบุรี			
338	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครราชสีมา			
339	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ขอนแก่น			
340	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต อุดรธานี			
341	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครสวรรค์			
342	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต พิษณุโลก			
343	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต เชียงใหม่			
344	สถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 39 แห่ง			
345	สถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา			
346	สถานีสื่อสารจังหวัดปราจีนบุรี			
347	สถานีสื่อสารจังหวัดสระแก้ว			
348	สถานีสื่อสารจังหวัดนครนายก			
349	สถานีสื่อสารจังหวัดระยอง			
350	สถานีสื่อสารจังหวัดจันทบุรี			
351	สถานีสื่อสารจังหวัดตราด			
352	สถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์			
353	สถานีสื่อสารจังหวัดสุรินทร์			
354	สถานีสื่อสารจังหวัดศรีสะเกษ			
355	สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี			
356	สถานีสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์			
357	สถานีสื่อสารจังหวัดมหาสารคาม			
358	สถานีสื่อสารจังหวัดร้อยเอ็ด			
359	สถานีสื่อสารจังหวัดชัยภูมิ			
360	สถานีสื่อสารจังหวัดยโสธร			
361	สถานีสื่อสารจังหวัดอำนาจเจริญ			
362	สถานีสื่อสารจังหวัดหนองคาย			
363	สถานีสื่อสารจังหวัดสกลนคร			
364	สถานีสื่อสารจังหวัดนครพนม			



ลงชื่อ: *[Signature]* ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ  
 ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ  
 ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ  
 ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ  
 ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ

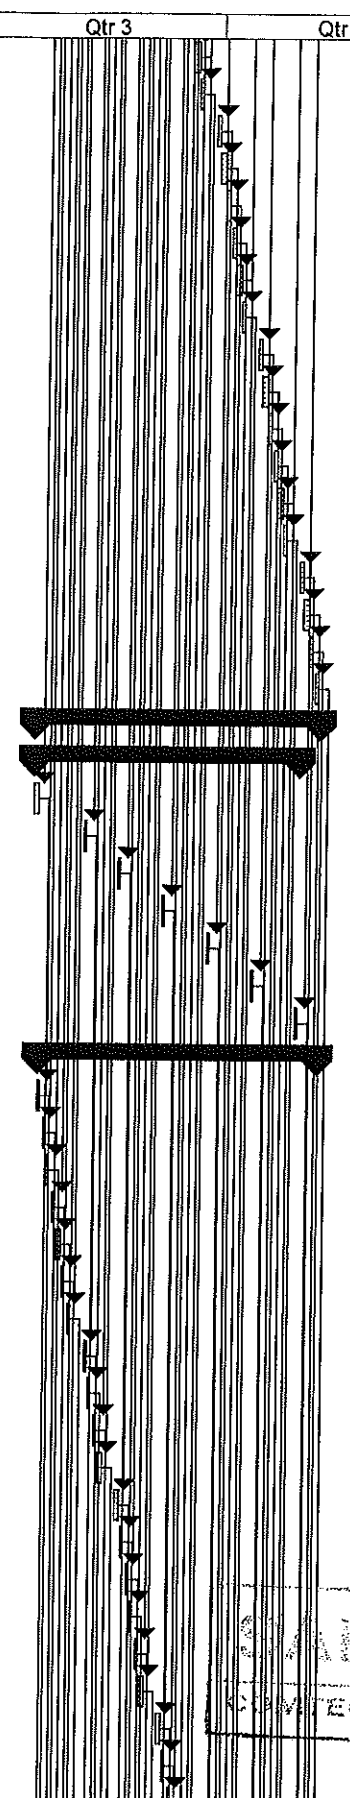

แผนการดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในชายกระทรวงมหาดไทย

ID	Task Name	2011					
		Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1
365	สถานีสื่อสารจังหวัดเลย						
366	สถานีสื่อสารจังหวัดมุกดาหาร						
367	สถานีสื่อสารจังหวัดหนองบัวลำภู						
368	สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์						
369	สถานีสื่อสารจังหวัดลพบุรี						
370	สถานีสื่อสารจังหวัดชัยนาท						
371	สถานีสื่อสารจังหวัดอุทัยธานี						
372	สถานีสื่อสารจังหวัดพิจิตร						
373	สถานีสื่อสารจังหวัดกำแพงเพชร						
374	สถานีสื่อสารจังหวัดตาก						
375	สถานีสื่อสารจังหวัดสุโขทัย						
376	สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์						
377	สถานีสื่อสารจังหวัดแพร่						
378	สถานีสื่อสารจังหวัดบ้าน						
379	สถานีสื่อสารจังหวัดพะเยา						
380	สถานีสื่อสารจังหวัดเชียงราย						
381	สถานีสื่อสารจังหวัดลำพูน						
382	สถานีสื่อสารจังหวัดลำปาง						
383	สถานีสื่อสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน						
384	การเชื่อมระบบโทรศัพท์ใหม่เข้ากับระบบโทรศัพท์และเครือข่ายเดิม(Migration) ระยะที่ 3						
385	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จำนวน 7 แห่ง						
386	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ชลบุรี						
387	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครราชสีมา						
388	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ขอนแก่น						
389	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต อุตรดิตถ์						
390	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต นครสวรรค์						
391	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต พิษณุโลก						
392	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต เชียงใหม่						
393	สถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 39 แห่ง						
394	สถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา						
395	สถานีสื่อสารจังหวัดปราจีนบุรี						
396	สถานีสื่อสารจังหวัดสระแก้ว						
397	สถานีสื่อสารจังหวัดนครนายก						
398	สถานีสื่อสารจังหวัดระยอง						
399	สถานีสื่อสารจังหวัดจันทบุรี						
400	สถานีสื่อสารจังหวัดตราด						
401	สถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์						
402	สถานีสื่อสารจังหวัดสุรินทร์						
403	สถานีสื่อสารจังหวัดศรีสะเกษ						
404	สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี						
405	สถานีสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์						
406	สถานีสื่อสารจังหวัดมหาสารคาม						
407	สถานีสื่อสารจังหวัดร้อยเอ็ด						
408	สถานีสื่อสารจังหวัดชัยภูมิ						
409	สถานีสื่อสารจังหวัดยโสธร						
410	สถานีสื่อสารจังหวัดอำนาจเจริญ						
411	สถานีสื่อสารจังหวัดหนองคาย						
412	สถานีสื่อสารจังหวัดสกลนคร						

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

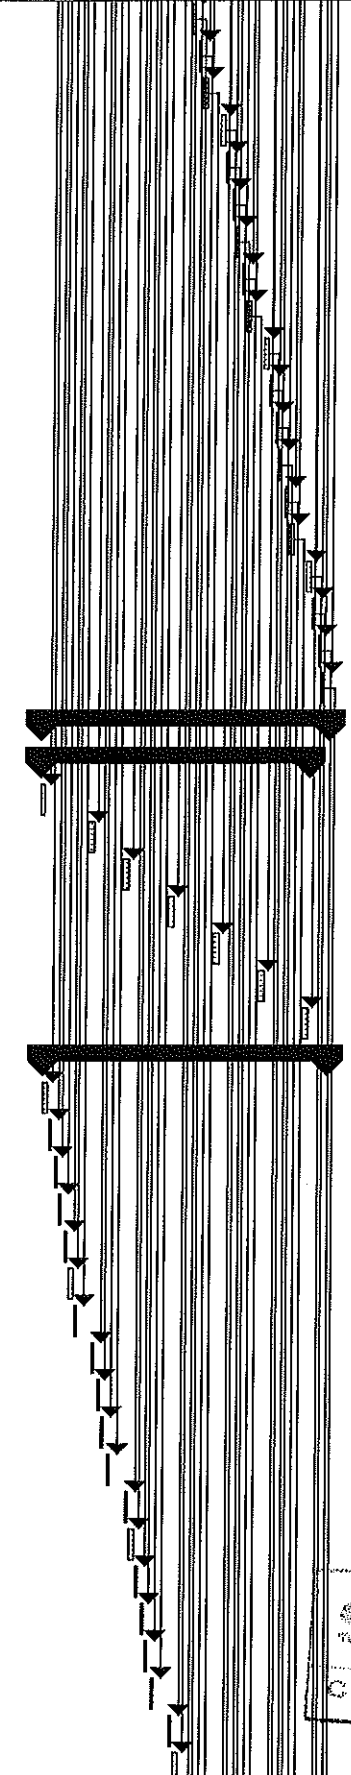

Project: MOI-99L-08  
Date: Thu 19/11/09

Task Progress Summary External Tasks Deadline

Split Milestone Project Summary External Milestone


(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

0162  
  
 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

แผนการดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในชายกระทรวงมหาดไทย

ID	Task Name	2011					
		Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1
413	สถานีสื่อสารจังหวัดนครพนม						
414	สถานีสื่อสารจังหวัดเลย						
415	สถานีสื่อสารจังหวัดมุกดาหาร						
416	สถานีสื่อสารจังหวัดหนองบัวลำภู						
417	สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์						
418	สถานีสื่อสารจังหวัดลพบุรี						
419	สถานีสื่อสารจังหวัดชัยนาท						
420	สถานีสื่อสารจังหวัดอุทัยธานี						
421	สถานีสื่อสารจังหวัดพิจิตร						
422	สถานีสื่อสารจังหวัดกำแพงเพชร						
423	สถานีสื่อสารจังหวัดตาก						
424	สถานีสื่อสารจังหวัดสุโขทัย						
425	สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์						
426	สถานีสื่อสารจังหวัดแพร่						
427	สถานีสื่อสารจังหวัดปาน						
428	สถานีสื่อสารจังหวัดพะเยา						
429	สถานีสื่อสารจังหวัดเชียงราย						
430	สถานีสื่อสารจังหวัดสาขุข						
431	สถานีสื่อสารจังหวัดลำปาง						
432	สถานีสื่อสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน						
433	การฝึกอบรม						
434	หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานประจำสถานีกลุ่มที่ 3						
435	หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานประจำสถานีกลุ่มที่ 4						
436	หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานประจำสถานีกลุ่มที่ 5						
437	การทดสอบในลักษณะ Overall System Test ระยะที่ 3						
438	การส่งมอบและตรวจรับโครงการระยะที่ 3						
439	การรับประกัน						
440	บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2 ปี						

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

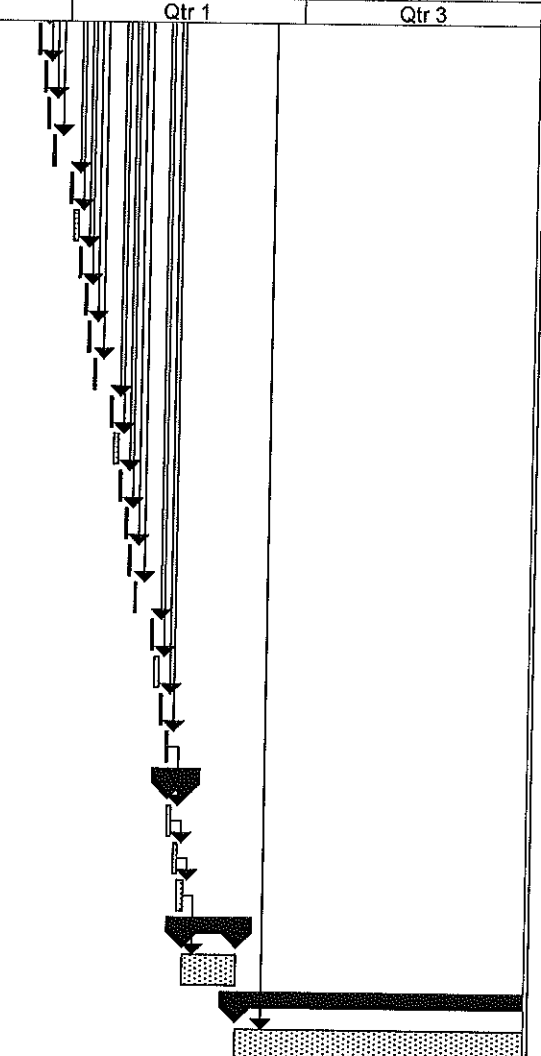

Project: MOI-99L-08 Date: Thu 19/11/09

Task Progress Summary External Tasks Deadline

Split Milestone Project Summary External Milestone

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

Page 7

(ลงชื่อ) SMART COMTECH CO., LTD. 016

( )

( )

( )
